

***ЗВІТ  
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА  
ІНФРАСТРУКТУРИ  
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ЗА I КВАРТАЛ 2024 РОКУ***



**На 2024 рік заплановано – 400 000,00 грн.,  
з них освоєно та профінансовано  
за I квартал 2024 року – 291 829,54 грн.**

Здійснювався контроль та виконувались роботи по наступним проєктам будівництва:

- ❑ - Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул.Бабича Олександра до будинку №43), вул. Мешка Миколи(на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м.Мукачево;
- ❑ - Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачево. Коригування;
- ❑ - Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево. Коригування.


**«Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул.Бабича  
Олександра до будинку №43), вул. Мешка Миколи (на ділянці від  
вул.Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на  
ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у  
м.Мукачево»**

**(кошторисна вартість об'єкта - 21 968 890, 00 грн.,  
освоєно – 98 945,17 грн.)**



На об'єкті підрядною організацією виконані роботи з підключення абонентів до мереж водопостачання, каналізації та водовідведення, а також роботи з розробки траншей, влаштування піщаної основи, влаштування трубопроводів та зворотна засипка з трамбуванням.

**«Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачево. Коригування»  
(кошторисна вартість об'єкта – 3 737 159,00 грн.,  
освоєно – 94 243,74 грн. )**

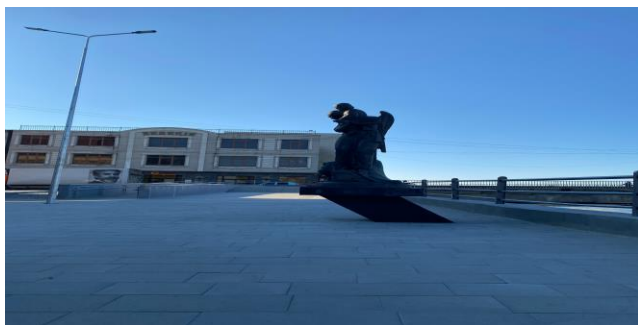

На об'єкті підрядною організацією виконані роботи з встановлення опор освітлення, змонтовано закладні деталі під опори паркового освітлення, прокладені мережі електропостачання, на пандусі змонтовано та пофарбовано поручні для маломобільних груп населення, закінчено облицювання гранітною плиткою вхідної групи пішохідної зони.

**«Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево.  
Коригування»  
(кошторисна вартість об'єкта - 19 698 614,00 грн.,  
освоєно – 98 640,63 грн.)**



Підрядною організацією виконані роботи по демонтажу бордюрних каменів, плитки ФЕМ на тротуарі та влаштування нових бордюрів, влаштування дорожнього корита для подальшого укладання шарів дорожнього одягу, а саме підсипного щебеневого шару для влаштування бетонної плити проїзної частини та пішохідних тротуарів.

## **Спеціалістами управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради в складі комісії обстежено стан будівель закладів освіти та культури на предмет аварійності:**

1. «Мукачівський дошкільний навчальний заклад №11 Мукачівської міської ради Закарпатської області».
2. «Мукачівський дошкільний навчальний заклад №5 Мукачівської міської ради Закарпатської області».
3. «Ключарківська гімназія Мукачівської міської ради Закарпатської області».
4. «Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області».
5. «Мукачівська загальноосвітня школа I- III ступенів № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області».
6. «Мукачівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 Мукачівської міської ради Закарпатської області».
7. «Мукачівський спортивно-оздоровчий комплекс дитячої юнацької спортивної школи Мукачівської міської ради Закарпатської області».
8. «Новодавидківський заклад дошкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області».
9. «Мукачівський дошкільний навчальний заклад №18 Мукачівської міської ради Закарпатської області».
10. «Мукачівський ліцей №6 Мукачівської міської ради Закарпатської області».

11. «Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міської ради Закарпатської області».

12. «Новодавидківська загальноосвітня школа I-III ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області».

13. «Дитячий оздоровчий табір "Мрія" Мукачівської міської ради Закарпатської області».

Проведені розрахунки з постачальниками за виконані роботи по наступним об'єктам:

- ✓ Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул. Бабича Олександра до будинку №43), вул. Мешка Миколи (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м. Мукачево;
- ✓ Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево. Коригування;
- ✓ Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачево. Коригування.

Здана звітність за 2023 рік

- ✓ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
- ✓ Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття;
- ✓ Звіт про капітальні інвестиції;
- ✓ Звіт про експорт - імпорт послуг.

Зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 77;
- наказів – 7;
- договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 7.

Внесені зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об'єкту: " Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачєво. Коригування».

На порталі Є-data оприлюднена інформація про укладені договори та додаткові угоди: 4 договорів та 3 додаткові угоди до договорів управління.

Згідно Положення Про набори даних Мукачівської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на портал data.gov.ua завантажено:

- титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою;
- фінансова та бюджетна звітність;
- річний план закупівель.

Проводиться висвітлення інформації про пророблену роботу та про прийняті рішення на сторінці управління будівництва та інфраструктури ММР (на сайті Фейсбук) та на офіційному сайті ММР.
